
ATELIER 1 — GESTION DE PROJET

1. Diagramme PERT des tâches

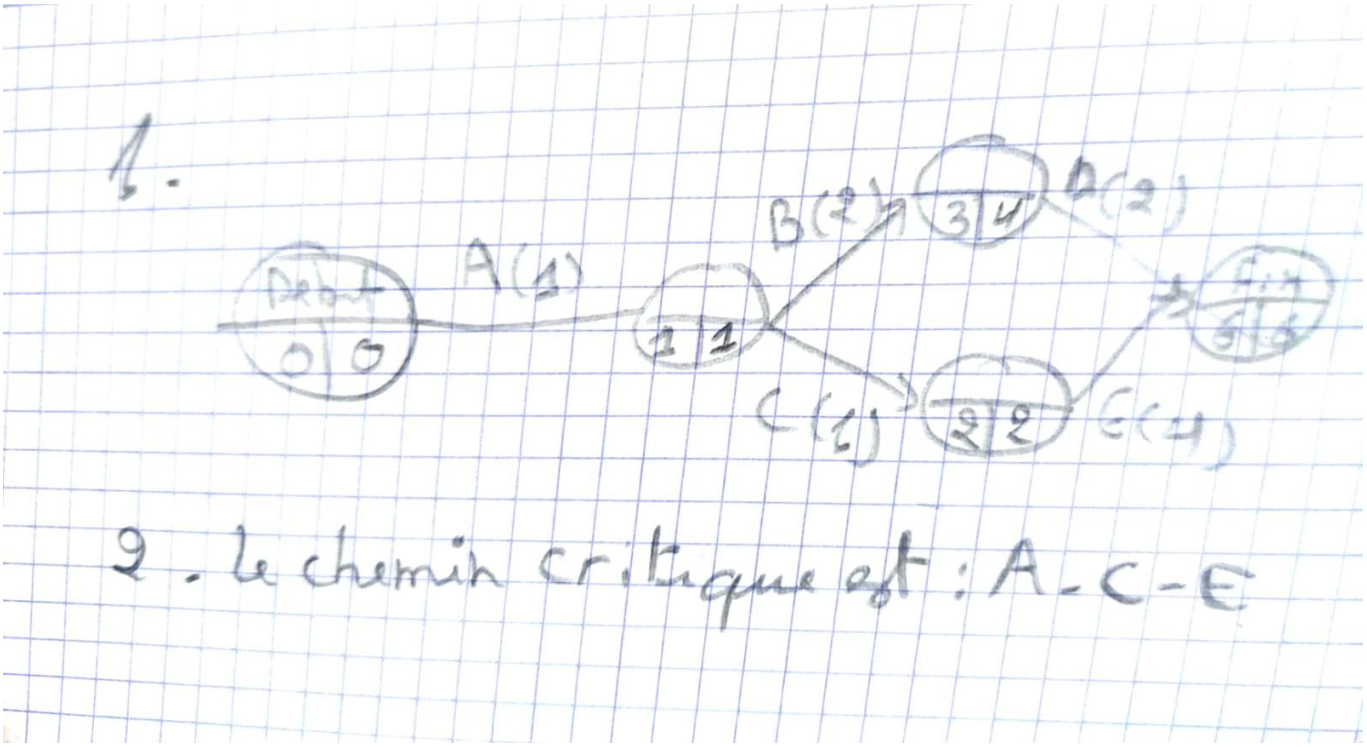


Détermination du chemin critique

Chemin	Calcul	Durée
A → B → D	1 + 2 + 2	5 jours
A → C → E	1 + 1 + 4	6 jours

Le chemin critique est A → C → E. Sa durée est de 6 jours. C'est le chemin le plus long ; un retard sur l'une de ces tâches retarde la fin du projet.

DOSSIER 2

1. Diagramme de Gantt

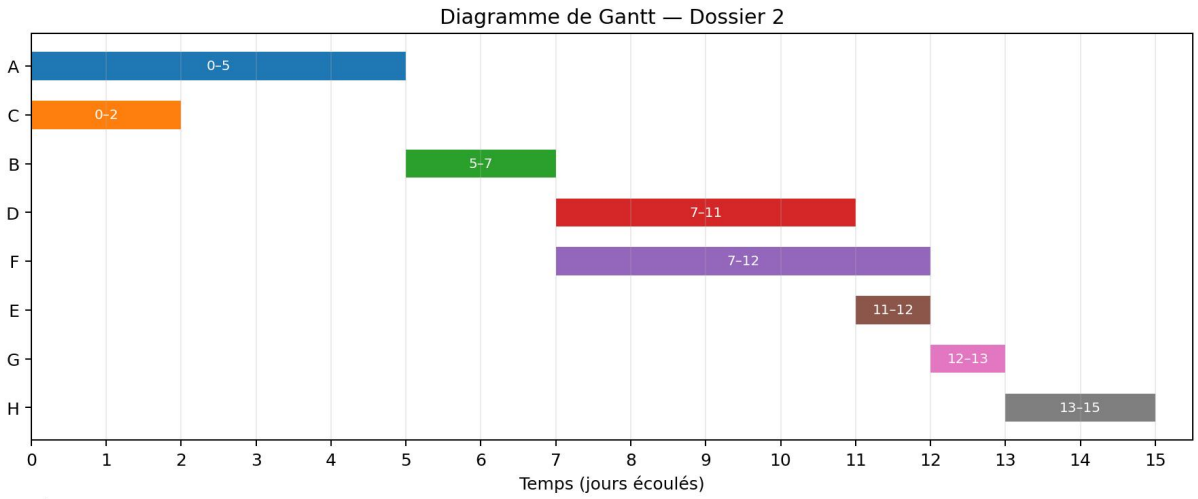

Tâches critiques : A, B, F, G et H

2. Identification du chemin critique

Chemin	Calcul	Durée
A → B → D → E → H	5 + 2 + 4 + 1 + 2	14 jours
A → B → F → G → H	5 + 2 + 5 + 1 + 2	15 jours
C → D → E → H	2 + 4 + 1 + 2	9 jours
C → F → G → H	2 + 5 + 1 + 2	10 jours

Le chemin critique est A → B → F → G → H. Sa durée totale est de 15 jours. C'est le chemin le plus long : les tâches qui le composent ont une marge nulle. Tout retard sur l'une de ces tâches entraîne donc un retard de la date de fin du projet.

Marges totales : C = 5 jours ; D = 1 jour ; E = 1 jour. Les tâches A, B, F, G et H ont une marge nulle.
